



ELABORAT O USPOSTAVI PRIVREMENOG DEPONIJIA ZA PRIHVAT I POSTUPANJE S MATERIJALOM OD UKLANJANJA NASTALIM U POSTUPKU OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

Izradili:

Jurica Krlježa, dipl.ing. prom.

Tomislav Hrastinski, struč.spec.ing.aedif.

Zlatko Lamešić, dipl.ing. prom.

Zagreb, 26. listopada 2022.



1. UVOD

Na temelju točke 10. Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 137/21) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 14. sjednici, 12. srpnja 2022., donijela je Provedbeni program mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba

Za potrebe privremenog skladištenja materijala od uklanjanja nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, potrebno je pripremiti prostor i zadovoljiti uvjete propisane tim programom.

Privremeno skladištenje i postupanje sa materijalom će se odvijati na lokaciji Tišinska 26, na radnoj jedinici „Reciklirani građevinski otpad“ (RGO) koje djeluje u sastavu Podružnice Zagrebačke ceste, do stavljanja u funkciju skladišta koje je određeno Odlukom o lokaciji nekretnine za privremeno skladištenje materijala od uklanjanja i /ili građevnog otpada nastalog kod obnove zgrada oštećenih potresom od 24. veljače 2022. godine (Čulinečka).

Za potrebe smještaja materijala od uklanjanja, potrebno je:

- snimiti postojeće stanje,
- definirati potrebne predradnje za prihvrat materijala,
- izračunati operativne troškove tj. definirati troškovnike za izvedbu radova,
- izvesti radove
- omogućiti prihvrat materijala u što kraćem roku sa max. kapacitetom zaprimanja
- definirati proceduru zaprimanja materijala, evidenciju, kontrolu i praćenje
- vraćanje lokacije u prvobitno stanje po ishodu uporabe dozvole u Čulinečkoj

2. Opis radne jedinice, rasporeda materijala, otpada i stanja na skladištu

RJ RGO nalazi se na lokaciji Tišinska 26 u Zagrebu u krugu odlagališta otpada „Prudinec-Jakuševac“.

Na toj lokaciji ćemo provoditi prihvaćanje građevinskog neopasnog otpada prema dozvoli za gospodarenje otpadom za 5 KB.

Za potrebe funkcioniranja ove radne jedinice, postoje 3 odvojena platoa:

- plato na kojem se nalazi drobilica površine cca 11.000m² zaprima se građevinski otpad i skladišti se dio recikliranih agregata, te uporaba u drobilici kapaciteta max 110 t/h;
- plato površine cca 3.000m² su smješteni reciklirani agregati, te kamen.
- plato na kojem će uz otpad od potresa koji je zaprimljen 2020. i 2021., te dio recikliranih agregata, biti formiran i plato za prihvrat materijala od uklanjanja – ukupna površina cca 21.000 m²



Slika 1. Postojeća lokacija RGO

2. PRIKAZ TRENUTNOG STANJA NA RJ RGO

Prema evidenciji po vrstama materijala postojeće stanje popunjenosti na sva tri deponija je slijedeći:

-reciklirani materijal RA-0/32=11.200 t

-reciklirani materijal RA-0/63=5.200 t

-reciklirani materijal PRA-0/32=22.900 t

-reciklirani materijal RA 32/90 =7.600 t

-neobrađeni otpad (u najvećoj mjeri otpad od potresa iz 2020-e godine) = 45.579,10 t



Na sljedećim slikama je prikaz deponija koji je potrebno reorganizirati kako bi se pripremio za prihvata materijala od potresa.



Slika 2. Prikaz deponija na dijelu koji bi se trebao pripremiti za prihvata materijala





Slika 3. Prikaz deponija na dijelu koji bi se trebao pripremiti za prihvatanje materijala – frezani materijal koji je potrebno ukloniti – 3.800t



Slika 4. Prikaz deponija na dijelu koji bi se trebao pripremiti za prihvatanje materijala – oporabljivi materijal od potresa koji je potrebno ukloniti 1.000t



Slika 5. Prikaz postojećeg deponija otpada od potresa 2020.- neobrađen koji je potrebno reorganizirati- potrebno prebaciti sa sjeverne na južnu stranu 7.000t od ukupnih 40.000t

3. UREĐENJE POVRŠINE ZA PRIHVAT

Za potrebe prihvata novog materijala nužno je reorganizirati postojeći deponij sa sjeverne strane (slika 2. i slika 5.) te prebaciti materijal (slika 3. i slika 4.) kako bi se formirao novi pravokutni deponij okvirnih dimenzija cca 2000m² za potrebe smještanja materijala od uklanjanja. Za reorganizaciju deponija potrebno je premjestiti:


- 7000t otpadne šute (slika 5.),
- 1000t očišćenog otpada (slika 4.)
- 3800t frezanog asfalta (slika 3.)

Ukupno 11.800 t

Također je potrebno podlogu postojećeg platoa urediti odnosno izravnati, nasipati sa materijalom, uvaljati te pripremiti za postavljanje silosnih elemenata visine 2,7m .

Postavljanjem silosnih elemenata visine 2,7m osim što se dobiva uređeno i čvrsto pravokutno tijelo za manipulaciju i prihvata materijala koji će fizički biti odvojen od ostalih, povećava se ujedno i kapacitet deponija te zidovi visine 2,7 m ujedno štite prelazak čestica prašine u okolno područje prilikom istovara. Nakon postavljanja, silosne elemente je potrebno zasuti materijalom s vanjske strane da bi se uravnotežio pritisak na iste i spriječilo prevrtanje.

Procjena je da bi se postavljanjem silosnih elemenata mogao postići kapacitet preko 10.000 m³ materijala od uklanjanja, što bi iznosilo oko 13.000t.

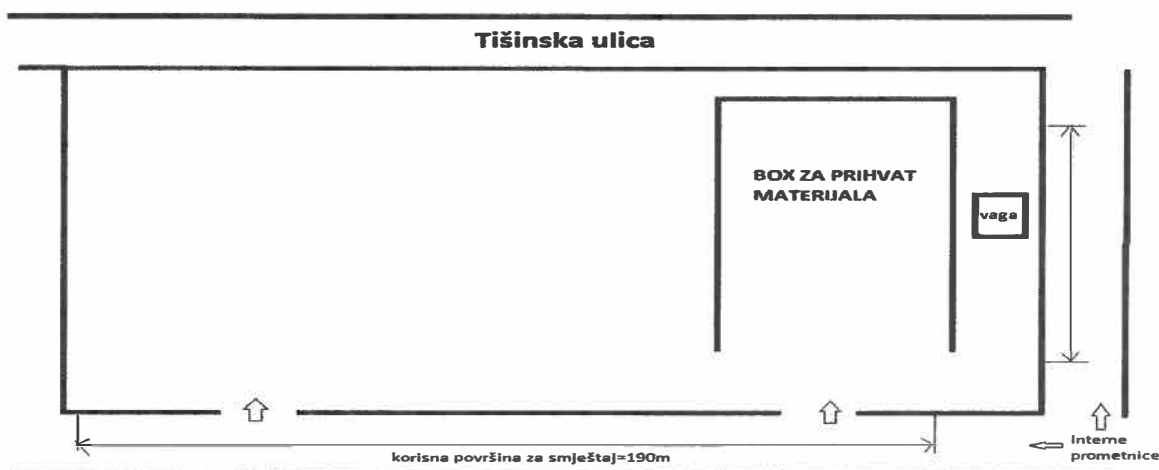

Slika 6. Skica smještaja boxova za prihvat materijala unutar platoa

**4. PROCJENA TROŠKOVA:**

Prema prethodno navedenoj analizi i potrebama procjena operativnih troškova za uspostavu deponija za primanje materijala odnosi se na sljedeće:

1. prebacivanje sa sjeverne na južnu stranu 7.000t od ukupnih 40.000t neobrađenog otpada od potresa nastalog 2020. godine – šuta – slika 5.
2. prebacivanje oporabljene materijala od potresa (1.000 t) i frezane asfaltne mase (3.800 t) – slika 4. i slika 3.
3. uređenje platoa kako bi se smjestili silosni elementi prema skici smještaja – slika 6.
4. dostava i postava silosnih elemenata
5. utovar i preseljenje materijala na Čulinečku po ishodu uporabe dozvole – vraćanje u prvobitno stanje deponija u Tišinskoj
6. troškovi skladištenja materijala na rok od 6 mjeseci- do ishoda uporabe i stavljanja u funkciju deponija u Čulinečkoj – 12.000 tona *224,74 kn/t/mj*6 mjeseci

Tablica 1. Procjena troškova

Redni broj	Vrsta operativnog troška	Iznos (kn)	Iznos (EUR)
1.	prebacivanje sa sjeverne na južnu stranu 7.000t od ukupnih 40.000t neobrađenog otpada od potresa nastalog 2020. godine – šuta – slika 5.	319.447 kn	42.397,91
2.	prebacivanje oporabljene materijala od potresa (1.000 t) i frezane asfaltne mase (3.800 t) – slika 4. i slika 3.	94.296 kn	12.515,23
3.	uređenja platoa kako bi se smjestili silosni elementi prema skici smještaja – slika 6.	74.566 kn	9.896,61
4.	dostava i ugradnja silosnih elemenata	530.022 kn	70.346,16
5.	utovar i preseljenje materijala na Čulinečku po ishodu uporabe dozvole – vraćanje u prvobitno stanje deponija u Tišinskoj	887.006 kn	117.725,93
6.	troškovi skladištenja materijala na rok od 6 mjeseci- do ishoda uporabe i stavljanja u funkciju deponija u Čulinečkoj	16.181.280 kn	2.147.624,93
UKUPNO		18.086.617 kn	2.400.506,60 €

**Napomena: Navedene cijene iskazane su bez PDV-a
KN-EUR (tečaj 7,53450)**

Kao podlogu procjeni troškova dostavljamo ovjerene Ponude/troškovnike temeljem koji smo izradili projekciju istih.



**zagrebačke
ceste**



**zagrebačke
ceste**

Prema Vašem zahtjevu dajemo Vam okvirnu projekciju troškova:

**TROŠKOVNIK
ZA PREMJEŠTANJE ŠUTE UNUTAR RJ RGO**

1. Rad kamiona sa tri ili više osovina 12-20 t	h	240,00	570,60	136.944,00
2. Rad bagera	h	120,00	548,30	65.796,00
3. Rad buldozera	h	120,00	550,00	66.000,00
4. Rad utovarivača	h	8,00	516,50	4.132,00
5. Rad radnika	h	8,00	189,20	1.513,60
ukupno kn				274.385,60
EUR (€)				36.417,23

KN - EUR (tečaj: 7,53450)

Napomena: u cijenu nije uračunat PDV. Obračun će se izvršiti prema stvarno izvršenim radovima

U Zagrebu, 24.10.2022.

Rukovoditelj sektora prodaje i tržišta::

Hrvoje Magasić struč. spec. ing. aedif.

ZAGREBAČKI HOLDING

PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE
Z A G R E B, Donje Svetice 48

■ ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZAGREBAČKE CESTE
Donje Svetice 48, 10000 Zagreb,
Tel. + 385 1 2356 444, faks: +385 1 2356 400
www.zgceste.hr

■ Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 03677702 - 008
OIB: 85584865987-008
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Zagreb
IBAN: HR6824020061400006982

Slika 7. Troškovnik za prebacivanje 7000t otpadne šute sa slike 5. – stavka br. 1 Tablice procjene troškova

■ ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZAGREBAČKE CESTE
Donje Svetice 48, 10000 Zagreb,
Tel. + 385 1 2356 444, faks: +385 1 2356 400
www.zgceste.hr

■ Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 03677702 - 008
OIB: 85584865987-008
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,
Zagreb
IBAN: HR6824020061400006982



Služba za komercijalne poslove
Odjel za prodaju, marketing i organizaciju izložbi
NAŠ ZNAK: IVZ/IB

MLASA: ZGH-24-22-1124
URBROJ: 12-11-22-02

U Zagrebu, 25. 10. 2022.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
podružnica ZAGREBAČKE CESTE

Donje Svetice 48
10000 Zagreb
e-mail: hrvoje.magesic@zgh.hr
e-mail: stanislav.veseljinovic@zgh.hr

**PREDMET: PONUDA ZA USLUGU RADA BULDOZERA
LOKACIJA RGO JAKUŠEVEC**

1. Usluga rada buldozera u redovno radno vrijeme	sati	120	x	213,00 kn	=	25.560,00 kn
2. Rad strojara u redovno radno vrijeme	sati	120	x	99,90 kn	=	11.988,00 kn
3. Usluga prijevoza buldozera kamionom (tabudicom)	sati	8	x	349,00 kn	=	2.792,00 kn
4. Usluga cisternu	sati	6	x	687,00 kn	=	4.122,00 kn
5. Rad vozača u redovno radno vrijeme	sati	6	x	99,90 kn	=	599,40 kn

UKUPNO = 45.061,40 kn

UKUPNO = 5.980,68 €

1 EUR = 7.53450 HRK

Cijena je bez PDV-a.

Plaćanje po ispostavljenom računu za izvršene usluge uz dostavu narudžbenice.

Molimo za vaše očitovanje.

S poštovanjem.

Služba za mehanizaciju i transport

Ivan Baobri, mag.ing.ing.

ZAGREBAČKI HOLDING
d.o.o.
PODRUŽNICA ZRINJEVAC
Zagreb, Remetinečka c. 15

Služba za komercijalne poslove

Odjel za prodaju, marketing i organizaciju izložbi
Irene Vlačić



■ **ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.**
Podružnica Zrinjevac

Zagreb, Remetinečka cesta 15
Tel. +385 1 659 88 88 fax +385 1 642 95 67
E-mail: ucinava.zrinjevac@zgh.hr

■ Trgovački sud u Zagrebu
MBS: 080042653, OIB: 85584865987
MB: 3677702-008
Izra. djelatnosti: 8130
Zagrebačka banka d.d.
IBAN: HR 4523600001400480322

Slika 8. Troškovnik za prebacivanje 7000t otpadne šute sa slike 5. – stavka br. 1 Tablice procjene troškova



**zagrebačke
ceste**



**zagrebačke
ceste**

Prema Vašem zahtjevu dajemo Vam okvirnu projekciju troškova:

TROŠKOVNIK
ZA PREMJEŠTANJE RECIKLIRANOG AGREGATA - FREZANE MASE I ŠUTE

1. Rad kamiona sa tri ili više osovina 12-20 t	h	96,00	570,60	54.777,60
2. Rad utovarivača	h	48,00	548,30	26.318,40
3. Rad buldožera	h	24,00	550,00	13.200,00
ukupno kn				94.296,00
EUR (€)				12.515,23

KN - EUR (tečaj: 7,53450)

Napomena: u cijenu nije uračunat PDV. Obračun će se izvršiti prema stvarno izvršenim radovima

U Zagrebu, 25.10.2022.

Rukovoditelj sektora prodaje / tržišta::

Hrvoje Magasić struč. spec. ing. arh. i grad. inž.

ZAGREBAČKI HOLDING
PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE
4 6 1 1 1 1, Donje Svetice 48

■ ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZAGREBAČKE CESTE
Donje Svetice 48, 10000 Zagreb,
Tel. + 385 1 2356 444, faks: +385 1 2356 400
www.zgceste.hr

■ Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 03677702 - 008
OIB: 85584865987 - 008
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Zagreb
IBAN: HR6824020061400006982

Slika 9. Troškovnik za prebacivanje prebacivanje oporabljene materijala od potresa (1.000 t) i frezane asfaltne mase (3.800 t) – slika 4. i slika 3. – stavka br. 2 Tablice procjene troškova

■ ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZAGREBAČKE CESTE
Donje Svetice 48, 10000 Zagreb,
Tel. + 385 1 2356 444, faks: +385 1 2356 400
www.zgceste.hr

■ Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 03677702 - 008
OIB: 85584865987 - 008
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,
Zagreb
IBAN: HR6824020061400006982



**zagrebačke
ceste**



**zagrebačke
ceste**

Prema Vašem zahtjevu dajemo Vam okvirnu projekciju troškova:

**TROŠKOVNIK
ZA UREĐIVANJE POVRŠINE I RAVNANJE PLATOVA**

1. Rad kamiona sa tri ili više osovina	h	8,00	570,60	4.564,80
2. Rad grejdera	h	8,00	575,00	4.600,00
4. Rad utovarivača	h	8,00	516,50	4.132,00
5. Rad radnika	h	8,00	199,90	1.599,20
6. Izrada nosivog sloja od drobljenog recikliranog agregata	m3	300,00	198,90	59.670,00
				ukupno kn 74.566,00
KN - EUR (tečaj: 7,53450)				EUR (€) 9.896,61

Napomena: u cijenu nije uračunat PDV. Oračun će se izvršiti prema stvarno izvršenim radovima

U Zagrebu, 25.10.2022.

Rukovoditelj sektora prodaje Mržišta::

Hrvoje Magasić *Hrvoje Magasić* spec. ing. aedif.

ZAGREBAČKI HOLDING

PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE
Z A G R E B Donje Svetice 48

■ ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZAGREBAČKE CESTE
Donje Svetice 48, 10000 Zagreb,
Tel. + 385 1 2356 444, faks: +385 1 2356 400
www.zgceste.hr

■ Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 03677702 - 008
OIB: 85584865987- 008
ERSTESSTEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Zagreb
IBAN: HR6824020061400006982

Slika 10. Troškovnik za uređenja platoa kako bi se smjestili silosni elementi prema skici smještaja – slika 6. stavka br. 3 Tablice procjene troškova

■ ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZAGREBAČKE CESTE
Donje Svetice 48, 10000 Zagreb,
Tel. + 385 1 2356 444, faks: +385 1 2356 400
www.zgceste.hr

■ Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 03677702 - 008
OIB: 85584865987- 008
ERSTESSTEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,
Zagreb
IBAN: HR6824020061400006982



	POZIV ZA DOSTAVU PONUDE br. 0310/2022	Datum: 25.10.2022.
--	--	--------------------

NARUČITELJ:	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica ZAGREBAČKE CESTE	Tel.: E-mail: monika.duvnjak@zgh.hr
IZVRŠITELJ: BETON-LUČKO d.o.o., Puškarićeva 1b, Zagreb	PONUĐA br. P-22-417.2	Datum: 25.10.2022.
OIB: 87429820265	Tel.: 01/5399-715, 098/275-928	Fax: E-mail: vandrasevic@betonlucsko.hr

R.br.	Šifra artikla	Naziv robe/usluge	Jed. mjere	Količina	Jedinična cijena bez PDV-a (kn)	Ukupno (kn)	Jedinična cijena (€)	Ukupno (€)
2		izrada, nabava, dostava i postavljanje SILOSA						
		bočni silosni element B-S	kom	120	3.867,00 kn	464.040,00 kn	513,24	61.588,80 €
		bočni silosni lijevi B-S/L	kom	6	3.867,00 kn	23.202,00 kn	513,24	3.079,44 €
		bočni silosni desni B-S/D	kom	6	3.867,00 kn	23.202,00 kn	513,24	3.079,44 €
		kutni silosni element KS	kom	6	2.155,00 kn	12.930,00 kn	286,02	1.716,12 €
		završni silosni element ZS	kom	4	1.662,00 kn	6.648,00 kn	220,59	882,36 €
PPOPRIJENOS POREZNE OBRIZE						538.822,00 kn		70.546,16 €

Rok za dostavu ponude:	dana
Rok isporuke / izvršenja od primitka ugovora/naručnice:	od 20.11.2022. - sukladno ugovoru
Mjesto isporuke robe / izvršenja usluge / radova:	PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE
Način i rok plaćanja:	50% avansna uplata, ostalo po računima
Opcija - valjanost ponude:	7 dana

Naručitelj
Fiksni tečaj konverzije: 1 euro=7,53450 kuna

Beton-Lučko d.o.o.
Izvršitelj

Napomena, molim da navedete:

za stavku 1. troškovnik koji je rok dostave

za stavku 2. troškovnik koji je rok dostave i postavljanje

Slika 11. Troškovnik dostave i ugradnje silosnih elemenata – stavka br. 4 Tablice procjene troškova



**zagrebačke
ceste**



**zagrebačke
ceste**

Prema Vašem zahtjevu dajemo Vam okvirnu projekciju troškova:

TROŠKOVNIK
ZA PRIJEVOZ SA LOKACIJE RGO NA LOKACIJU ČULINEČKA

1. Prijevoz šute sa lokacije RGO na lokaciju Čulinečka	t	13.000,00	60,20	782.600,00
2. Rad utovarivača na utovaru	h	140,00	516,50	72.310,00
3. Rad radnika na vagi	h	80,00	199,20	15.936,00
4. Rad radnika na prijemu	h	40,00	199,20	7.968,00
5. Rad radnika na evidenciji	h	40,00	204,80	8.192,00
ukupno				887.006,00
KN - EUR (tečaj: 7,53450)				EUR (€) 117.725,93

Napomena: u cijenu nije uračunat PDV. Obračun će se izvršiti prema stvarno izvršenim radovima

U Zagrebu, 24.10.2022.

Rukovoditelj sektora prodaje i tržišta:

Hrvoje Magašić struč. spec. ing. aedif.

ZAGREBAČKI HOLDING
PODRUŽNICA ZAGREBAČKE CESTE
ZAGREB, Donje Svetice 48

■ ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZAGREBAČKE CESTE
Donje Svetice 48, 10000 Zagreb,
Tel. + 385 1 2356 444, faks: +385 1 2356 400
www.zgceste.hr

■ Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 03677702 - 008
OIB: 85584865987 - 008
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Zagreb
IBAN: HR6824020061400006982

Slika 12. Troškovnik utovara i preseljenje materijala na Čulinečku po ishođenju uporabne dozvole – vraćanje u prvobitno stanje deponija u Tišinskoj – stavka br. 5 Tablice procjene troškova

■ ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica ZAGREBAČKE CESTE
Donje Svetice 48, 10000 Zagreb,
Tel. + 385 1 2356 444, faks: +385 1 2356 400
www.zgceste.hr

■ Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 03677702 - 008
OIB: 85584865987 - 008
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,
Zagreb
IBAN: HR6824020061400006982



Opis radnje	Jedinica	Jedinična cijena za 9.2022. ANALIZA TRŽIŠTA	Jedinična cijena za 2020.	Jedinična cijena za 2021.
skladištenje (postupak R13)	HRK/t/mjesec	224,74	197,18	211,77
čišćenje i usitnjavanje (postupak uporabe R5 i/ili R12)	HRK/t	211,19	180,03	197,43

Slika 13. Cjenik troškova skladištenja materijala prema usporednoj analizi tržišta skladištenja robe i najma prostora, Ekonergh d.o.o., Klasa: ZGH-09-22-673, UR.br.: 01-08-01/4-00-22-01– stavka br. 6 Tablice procjene troškova



5. Procedura upravljanja deponijem

Uspostavom privremenog deponija, sukladno Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom definira se procedura upravljanja deponijem u Tišinskoj ulici odnosno način i postupak zaprimanja materijala.

Procedura se definira kroz slijedeće korake sa popratnom dokumentacijom:

- *Dovoz materijala na vagu;*
- *Odlazak do kućice zbog kontrole materijala i dokumentacije, gdje se vrši vizualni pregled materijala, slikanje kamiona s registracijom i materijalom kojega dovozi te nakon toga daje se uputa vozaču gdje treba istovariti materijal. Prije istovara potrebno je materijal navlažiti kako bi se maksimalno spriječilo širenje čestica prašine u okoliš;*
- *Izlazno vaganje i utvrđivanje neto količine, te potom upis u „Očevidnik o dovozu materijala (prilog 1) od izvođača radova“ i izdavanje vagarskog lista kao „Usluga vaganja“. Na vagarskom listu vidljivo je koliko je i kojeg materijala dovezeno, gdje je iskazana neto količina materijala. Prilog 2 (vagarski list). Nakon druge odvage, kamion napušta prostor RGO-a*

Ako se vizualnim pregledom utvrdi da dopremljeni materijal ne odgovara deklariranom sadržaju za materijal ili sadrži opasne tvari ili opasni otpad, vozilu neće biti dozvoljen istovar u privremeno skladište.

U tom slučaju će vagar ponovo vagati kamion kojem nije dopušteno istovariti materijal na kojem će se napisati u napomenu, razlog zbog čega mu nije dozvoljeno istovariti materijal. Isto će biti popraćeno dodatnim sumarnim dokumentom (Prilog 3 – ODBIJENI DOVOZ MATERIJALA)

**Prilog 1 – OČEVIDNIK O DOVOZU MATERIJALA:**

Na temelju točke 10. Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 137/21) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 14. sjednici, 12. srpnja 2022., donijela je

PROVEDBENI PROGRAM
mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku
obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba

Datum: _____

OČEVIDNIK O DOVOZU MATERIJALA OD IZVOĐAČA RADOVA

<i>Broj</i>	<i>Registracija</i>	<i>Tvrtka</i>	<i>Ime i prezime vozača (čitko) / Potpis</i>	<i>Adresa s koje dolazi materijal (gradilište)</i>	<i>Broj vagarinke</i>
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					



Prilog 2 (vagarski list):

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Zagrebačke Ceste Donje Svete 48, 10000 Zagreb Radna jedinica: RGO, Tihinska 20 OIB: 85584865987, Tel.: 01 642 21 92, Fax.: 01 642 98 92 NORMA: HRN EN 13242		
VAGARSKI LIST br.: 2022-1-11238		
Prijevoznik:	A.P. Lukac Zdenko Janka Leskovara 29 OIB: 67127481229	Pregrada
Vozač:		
Registracija:	ZG 1531 HV	
Teret:	Usluga vaganja	
Organizacijska jedinica: << >>		
Vagar:	ULAZNO VAGANJE	IZLAZNO VAGANJE
Bedeniković:	Datum: 25.10.2022	Datum: 25.10.2022
Matija	Vrijeme: 07:45:47	Vrijeme: 07:46:53
	Masa: 12.060 kg	Masa: 28.340 kg
Netto: 16.280 kg		
Dovoz materijala od rušenja objekata s Palmotičeve (crijep i beton).		
Posiljatelj:	Prijevoznik (Vozač):	Primatelj:
QF-851H-02		

U prilogu 2 je napravljena „Usluga vaganja“ kao primjer kako će izgledati vaganje kamiona od izvođača radova gdje je napisana napomena koja se nalazi ispod netto odvage.



Prilog 3 – ODBIJENI DOVOZ MATERIJALA:

Na temelju točke 10. Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 137/21) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 14. sjednici, 12. srpnja 2022., donijela je

PROVEDBENI PROGRAM

**mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku
obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba**

Datum: _____

ODBIJENI DOVOZ MATERIJALA OD IZVOĐAČA RADOVA

Broj	Registracija	Tvrtka	Adresa s koje dolazi materijal (gradilište)	Broj vagarinke
1.				
Razlog:				
2.				
Razlog:				
3.				
Razlog:				
4.				
Razlog:				
5.				
Razlog:				

Elaborat izradili:

Jurica Krleža, dipl.ing. prom.

Tomislav Hrastinski, struč.spec.ing.aedif.

Zlatko Lamešić, dipl.ing. prom.

Voditelj Podružnice Zagrebačke ceste:

Jurica Krleža, dipl. ing. prom.

Prilog 3 – ODBIJENI DOVOZ MATERIJALA:

Na temelju točke 10. Odluke o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (Narodne novine 137/21) i članka 41. točke 34. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18, 23/18, 3/20, 3/21, 11/21 - pročišćeni tekst i 16/22), Gradska skupština Grada Zagreba, na 14. sjednici, 12. srpnja 2022., donijela je

PROVEDBENI PROGRAM

mjera postupanja s materijalom od uklanjanja i građevnim otpadom nastalim u postupku obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba

Datum: _____

ODBIJENI DOVOZ MATERIJALA OD IZVOĐAČA RADOVA

<i>Broj</i>	<i>Registracija</i>	<i>Tvrтка</i>	<i>Adresa s koje dolazi materijal (gradilište)</i>	<i>Broj vagarinke</i>
1.				
Razlog:				
2.				
Razlog:				
3.				
Razlog:				
4.				
Razlog:				
5.				
Razlog:				

Elaborat izradili:

Jurica Krleža, dipl.ing. prom.

Tomislav Hrastinski, struč.spec.ing.aedif.

Zlatko Lamešić, dipl.ing. prom.



Voditelj Podružnice Zagrebačke ceste:

Jurica Krleža, dipl. ing. prom.

